


苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程(第二標)

#10、#11 施工預定期程表

施工項目	預定開始時間	預定結束時間
施工便道臨時大門設置需2天	2019/12/15	2019/12/17
施工便道交維佈設1天	2019/12/17	2019/12/18
#10、#11工作井試挖作業需2天	2019/12/18	2019/12/20
#10(18.19M)工作井開設完成需26天	2019/12/20	2020/1/25
#10(18.19M)大底鋼筋綁紮及澆置需3天	2020/1/15	2020/1/18
#11(22.71M)工作井開設完成需31天	2020/1/18	2020/2/17
#11(22.71M)大底鋼筋綁紮及澆置需3天	2020/2/14	2020/2/17
108.02.17 聯合大學預定開學日		

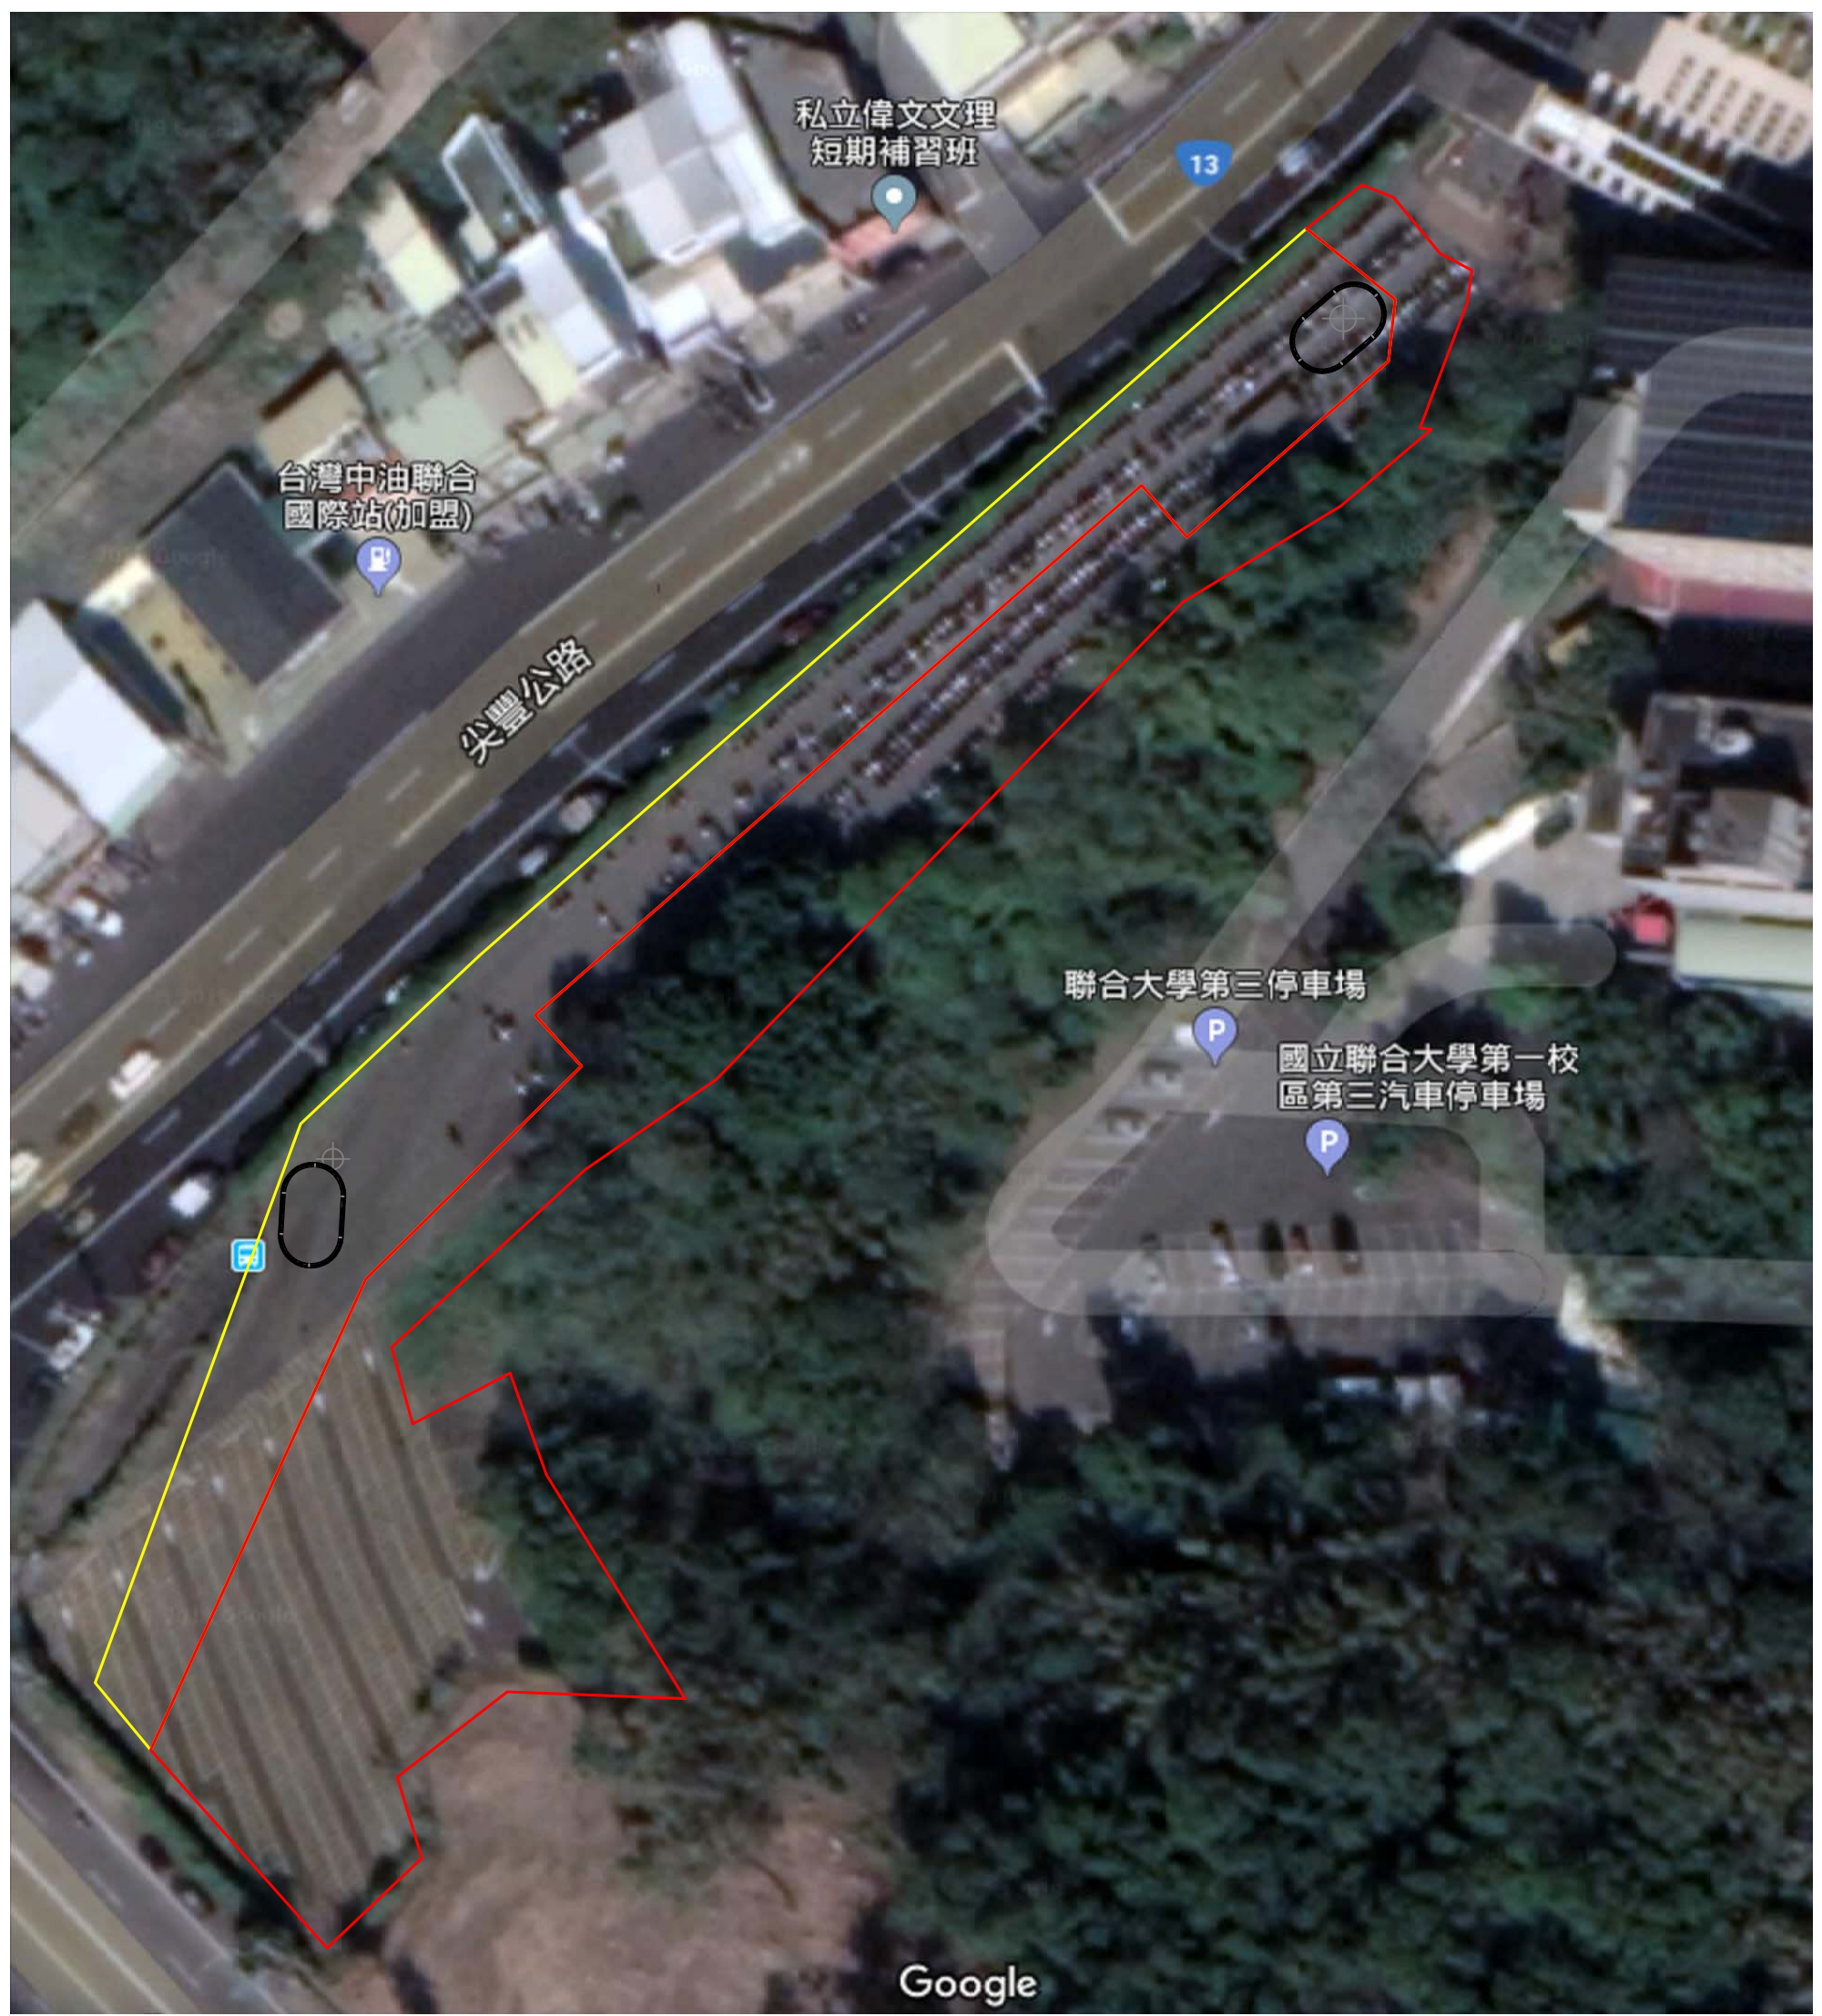

私立偉文文理
短期補習班

13


台灣中油聯合
國際站(加盟)


尖豐公路


聯合大學第三停車場

國立聯合大學第一校
區第三汽車停車場

Google

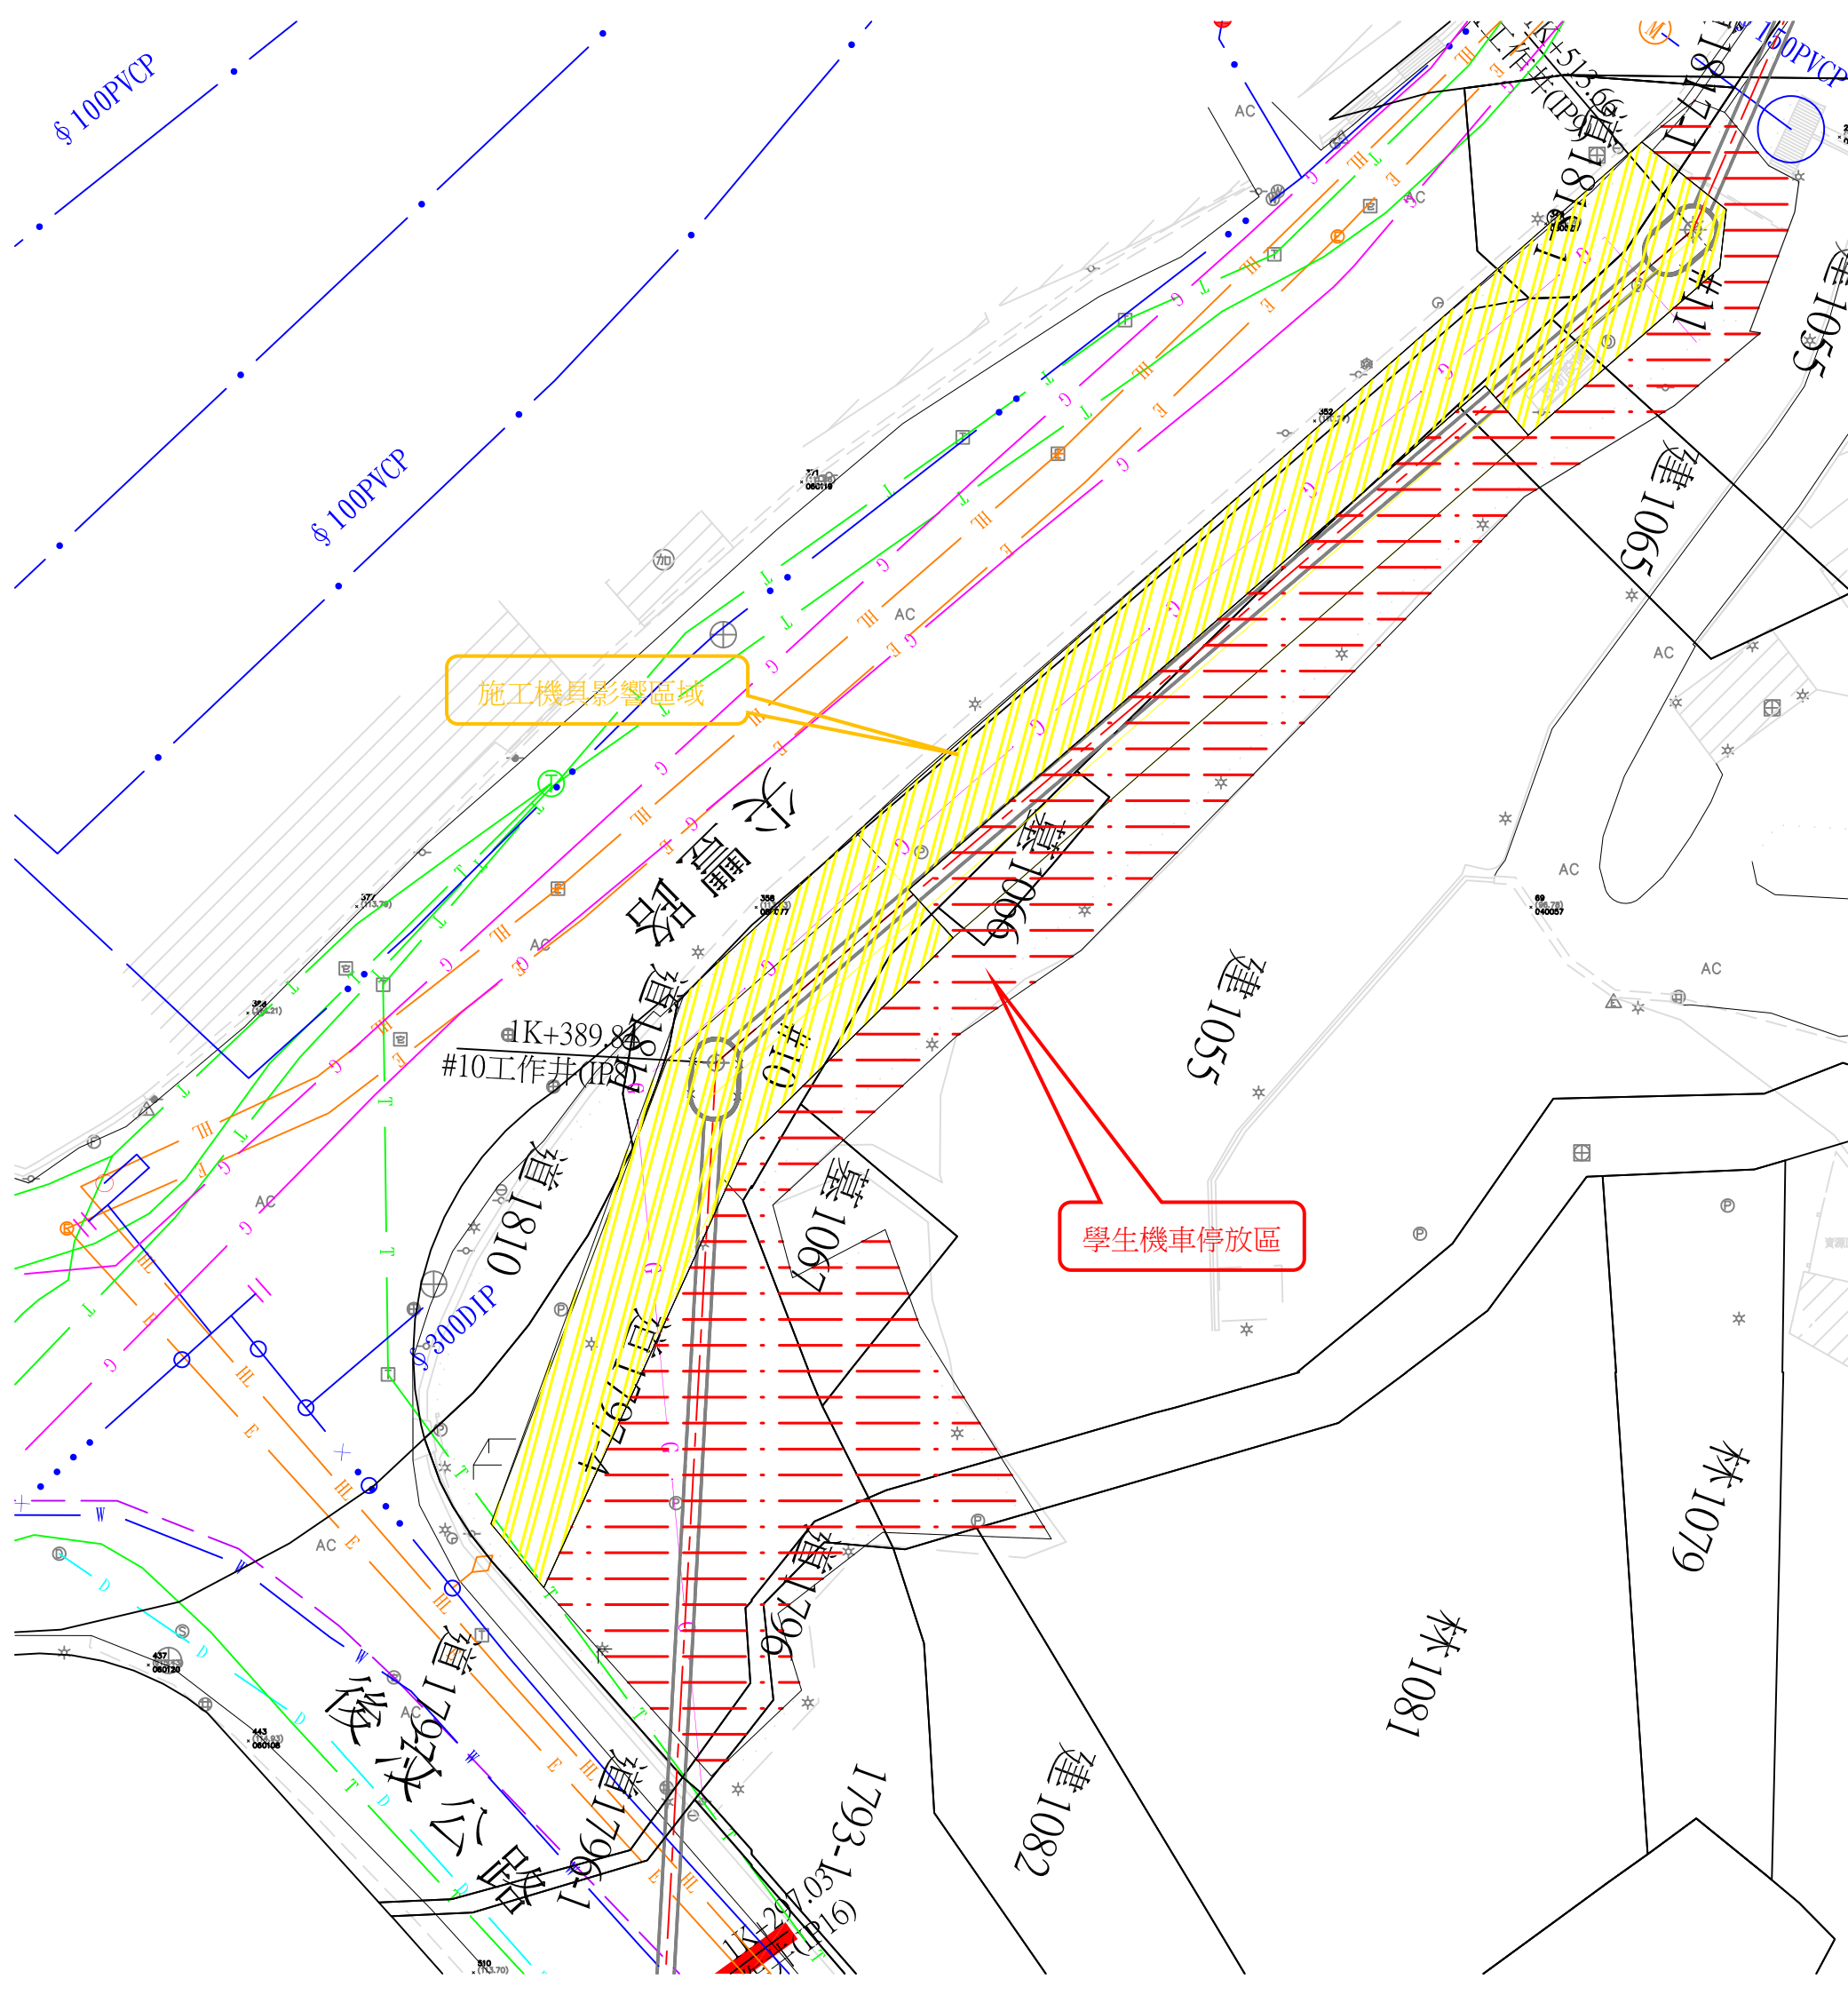

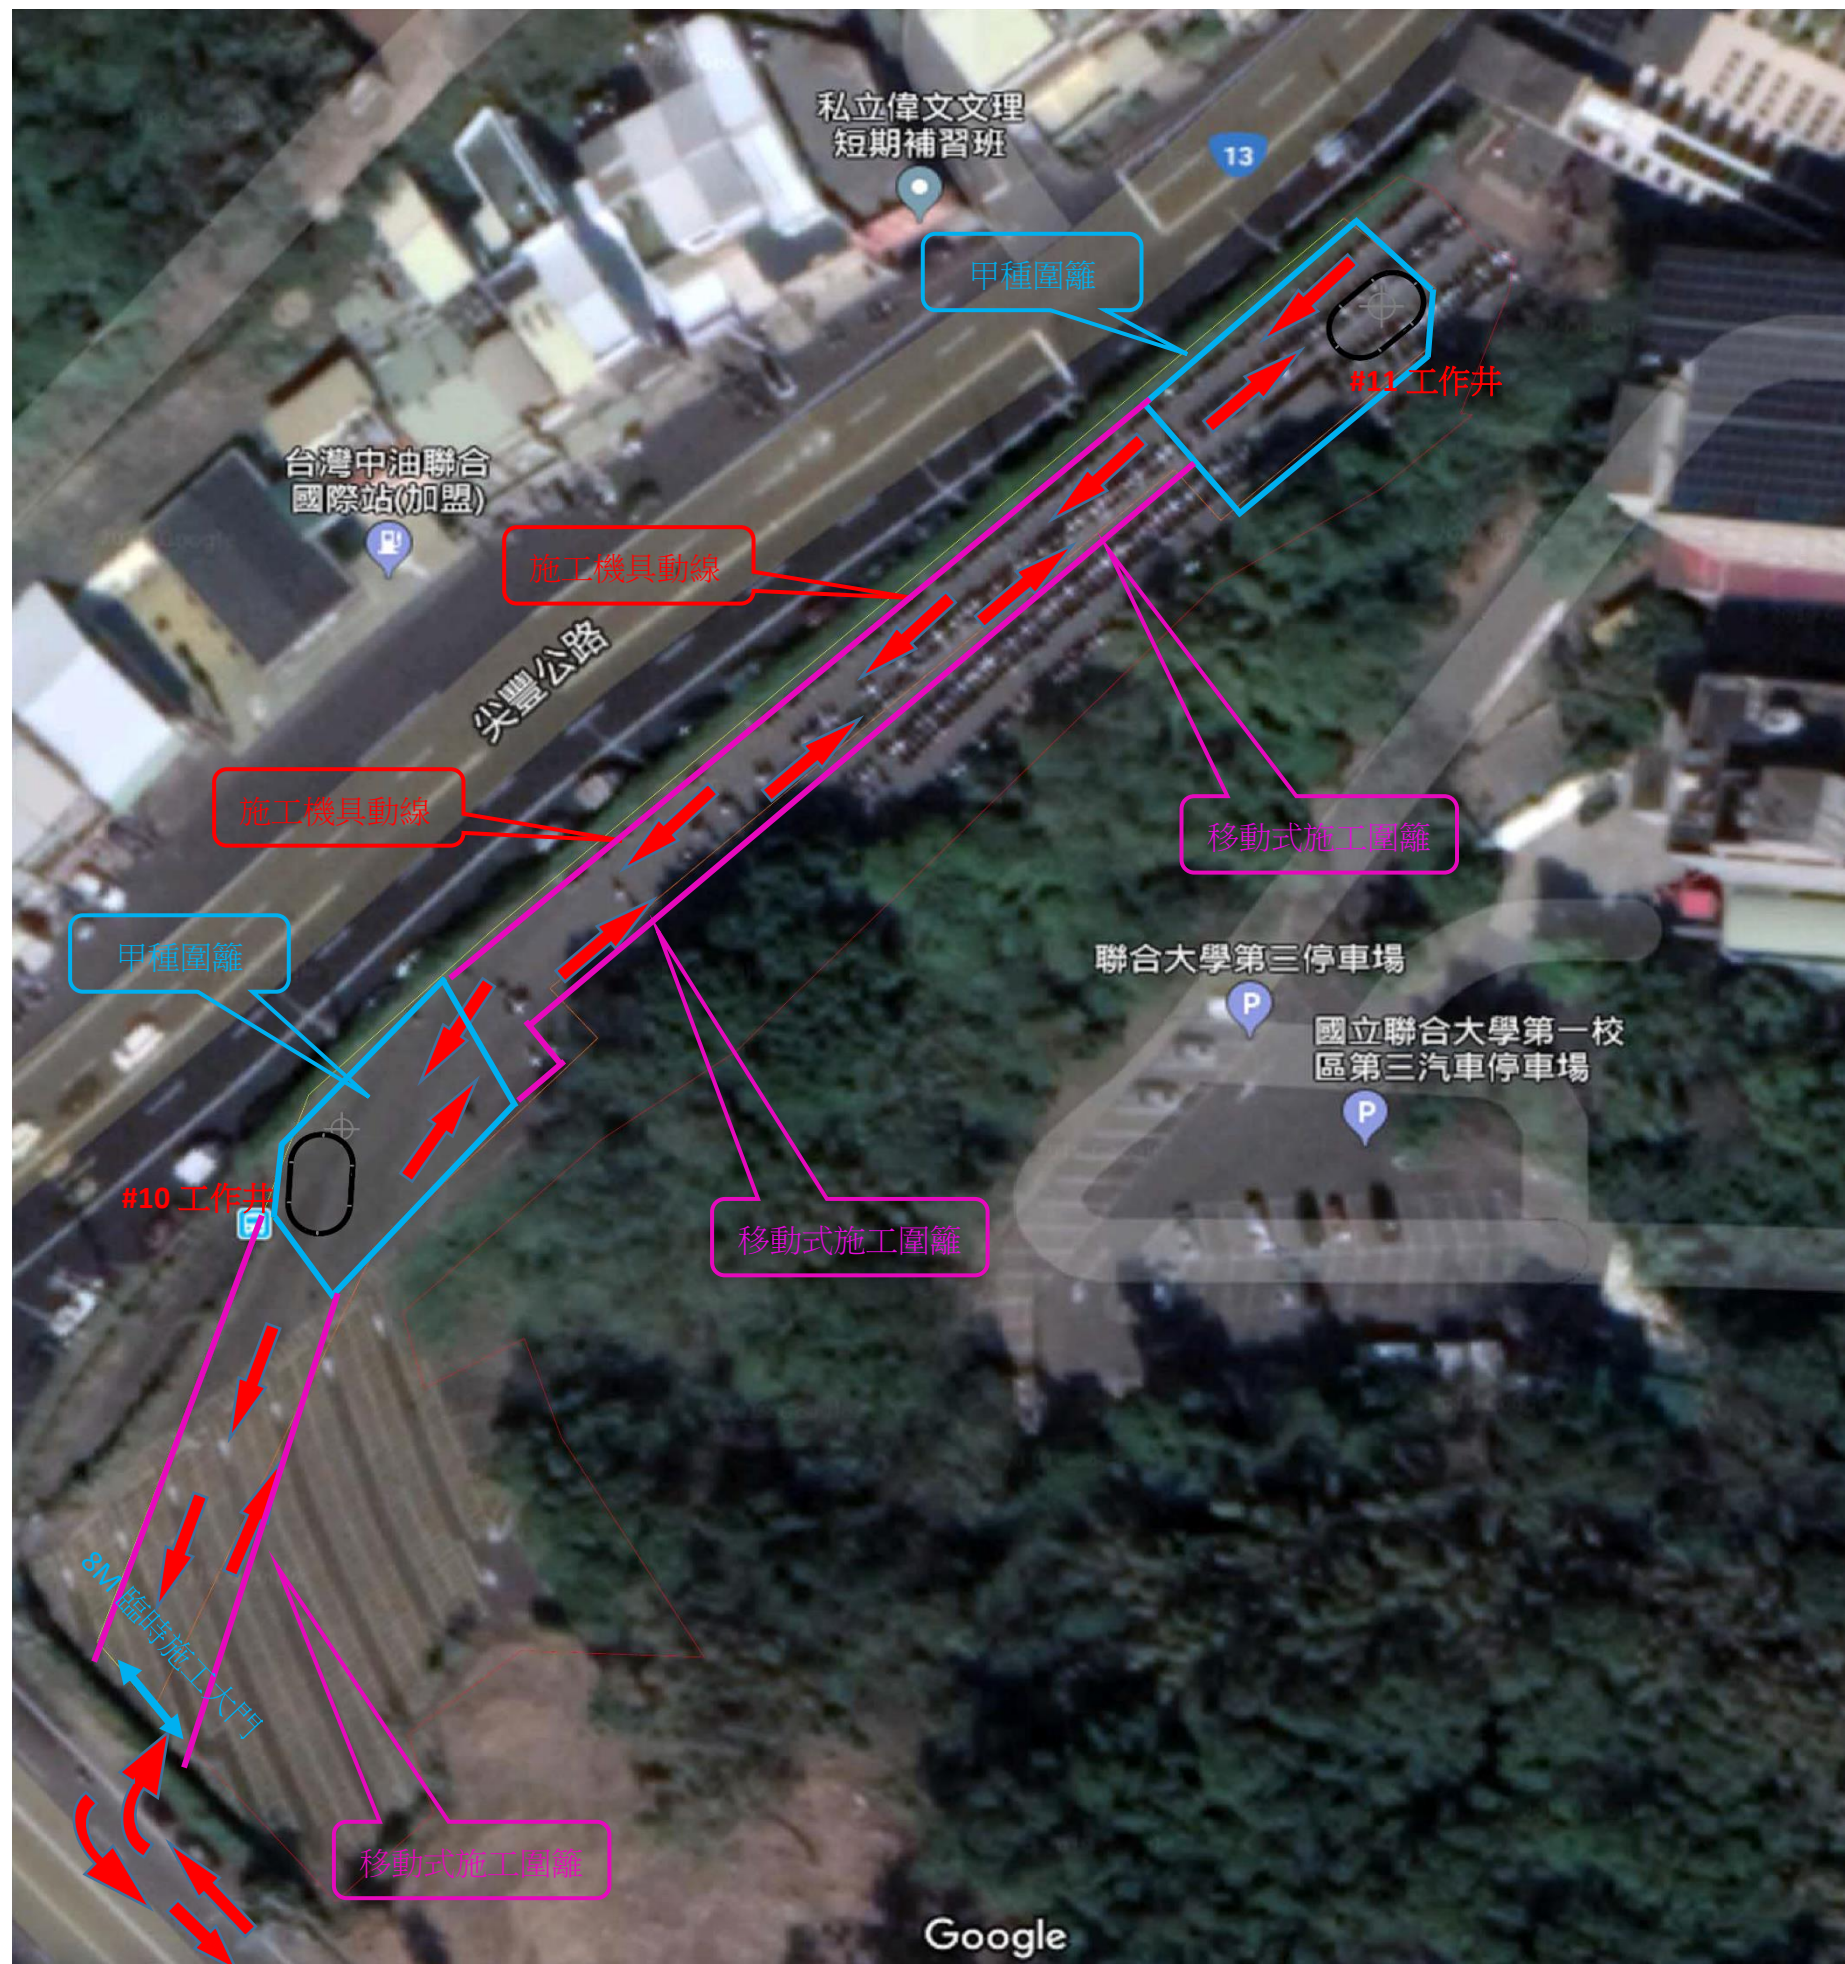

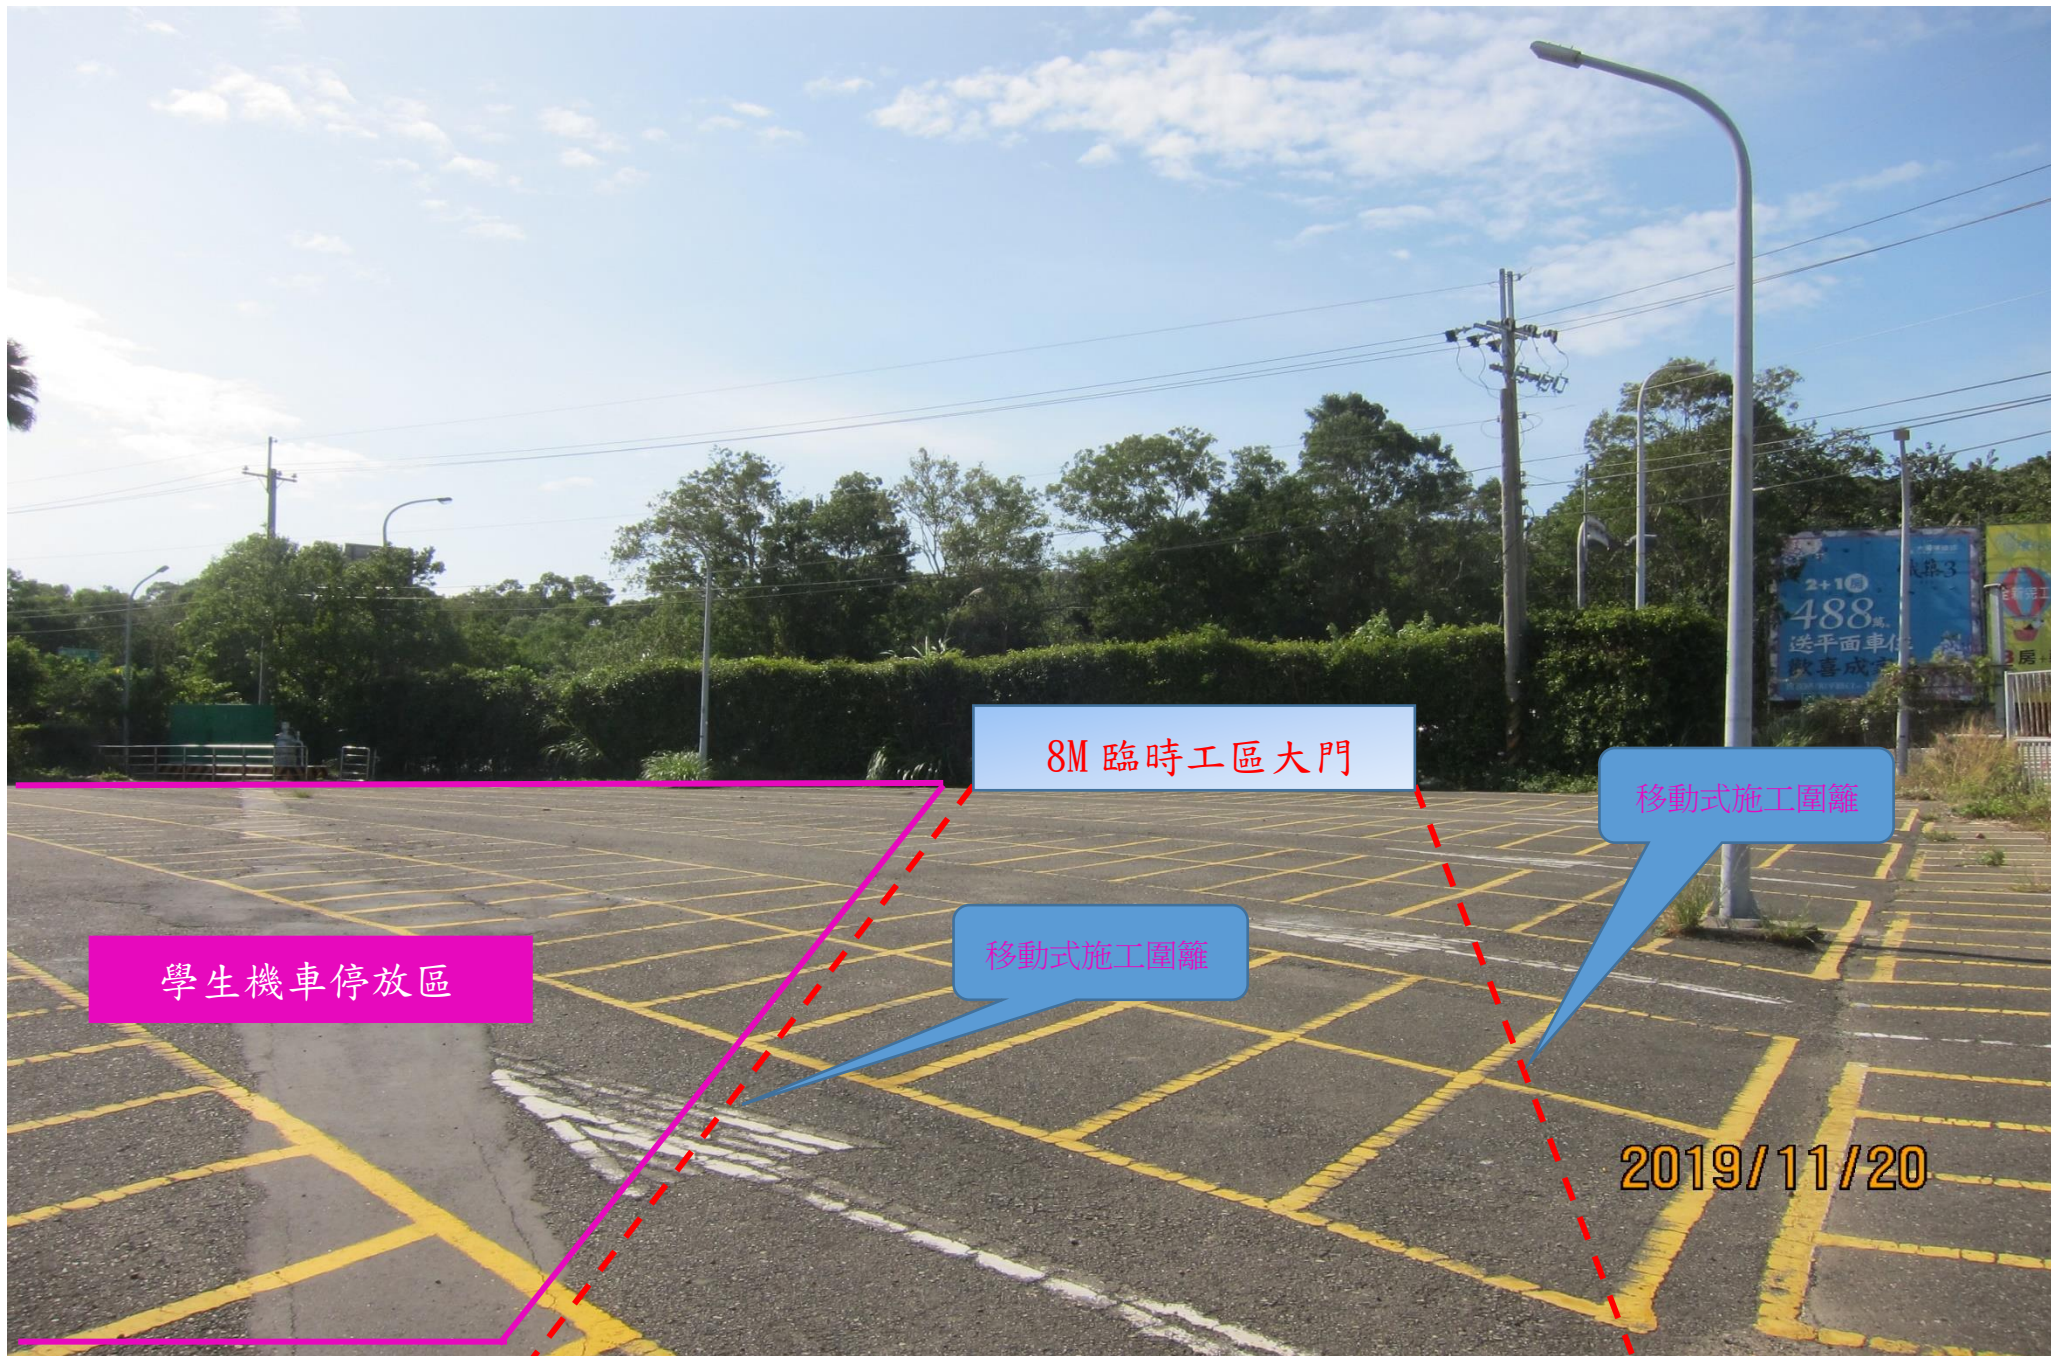

學生機車停放區

8M 臨時工區大門

移動式施工圍籬

移動式施工圍籬

2019/11/20



甲種圍籬

移動式施工圍籬

#10 工作井

甲種圍籬

2019/11/20

